

Планирование




Программа **Планирование** – это оптимальный набор ресурсов для организации работ в любом предприятии.



Программа Планирование

Основное окно

Панель управления

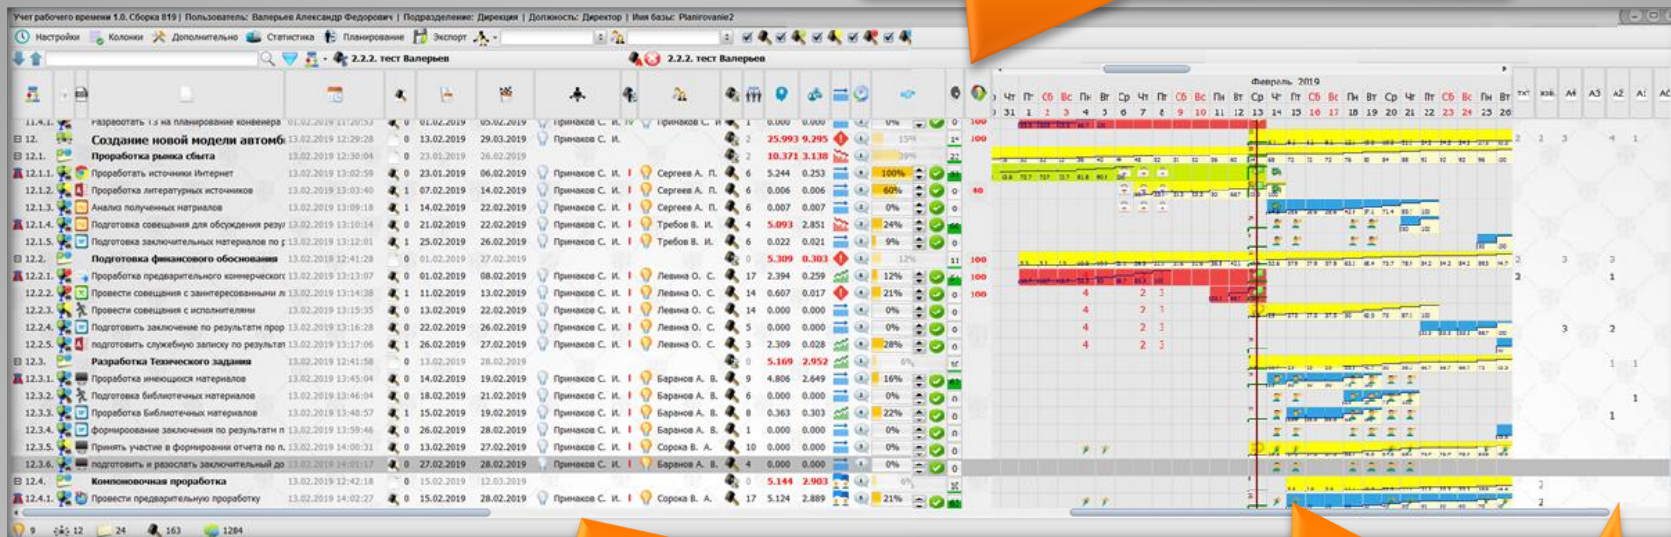

Электронный график

“Шахматка”

“Бумажные”
результаты
работы

Программа Планирование

Основное окно (Электронный график).

Уровень
работы

Учет рабочего времени 1.0. Сборка 819 | Пользователь: Валерьев Александр Федорович | Подразделение: Дирекция | Должность: Директор | Имя базы: Planirovanie2

Настройки

Колонки

Дополнительно

Статистика

Планирование

Экспорт

2.2.2. тест Валерьев

2.2.2. тест Валерьев

11.4.1.	Разработать ТЗ на планирование конвейера	01.02.2019 11:20:53	0	01.02.2019	05.02.2019	Примаков С. И.	1	0.000	0.000	0%
12.	Создание новой модели автоб	13.02.2019 12:29:28	0	13.02.2019	29.03.2019	Примаков С. И.	2	25.993	9.295	15%
12.1.	Проработка рынка сбыта	13.02.2019 12:30:04	0	23.01.2019	26.02.2019	Примаков С. И.	2	10.371	3.138	39%
12.1.1.	Проработать источники Интернет	13.02.2019 13:02:59	0	23.01.2019	06.02.2019	Примаков С. И.	6	5.244	0.253	100%
12.1.2.	Проработка литературных источников	13.02.2019 13:03:40	1	07.02.2019	14.02.2019	Примаков С. И.	6	0.006	0.006	60%
12.1.3.	Анализ полученных матриалов	13.02.2019 13:09:18	1	14.02.2019	22.02.2019	Примаков С. И.	6	0.007	0.007	0%
12.1.4.	Подготовка совещания для обсуждения резу	13.02.2019 13:10:14	0	21.02.2019	22.02.2019	Примаков С. И.	4	5.093	2.851	24%
12.1.5.	Подготовка заключительных материалов по р	13.02.2019 13:12:01	1	25.02.2019	26.02.2019	Примаков С. И.	6	0.023	0.021	0%
12.2.	Подготовка финансового обоснования	13.02.2019 12:41:28	0	01.02.2019	27.02.2019	Примаков С. И.	0			
12.2.1.	Проработка предварительного коммерческого	13.02.2019 13:13:07	0	01.02.2019	08.02.2019	Примаков С. И.	17			
12.2.2.	Провести совещания с заинтересованными л	13.02.2019 13:14:38	1	11.02.2019	13.02.2019	Примаков С. И.				
12.2.3.	Провести совещания с исполнителями	13.02.2019 13:15:35	0	13.02.2019	22.02.2019	Примаков С. И.				
12.2.4.	Подготовка заключения по результатам прор	13.02.2019 13:15:38	0	22.02.2019	25.02.2019	Примаков С. И.				
12.2.5.	Подготовка заключения по результатам прор	13.02.2019 13:15:38	1	26.02.2019	26.02.2019	Примаков С. И.				
12.3.										
12.3.1.										
12.3.2.										
12.3.3.										
12.3.4.										
12.3.5.										
12.3.6.										
12.4.										
12.4.1.										

9 12 24 163 1284

Дата и время создания работы, графика, проекта

Дата и время начала работ

Дата и время окончания работ

Наимено-
вание
работы,
графика,
проекта

Дата и время
создания
работы,
графика,
проекта

Дата и
время
начала
работ

Дата и
время
окончан
ия
работ

Программа Планирование

Основное окно (Электронный график).

Учет рабочего времени 1.0. Сборка 819 | Пользователь: Валерьев Александр Федорович | Подразделение: Дирекция | Должность: Директор

Настройки Колонки Дополнительно Статистика Планирование

Иерархия	Наименование задачи	Дата начала	Дата окончания	Исполнитель	Руководитель	Планируемая трудоемкость	Фактическая трудоемкость	Состояние
12.1.1.	Проработать источники Интернет	13.02.2019 13:02:59	23.01.2019 06.02.2019	Примаков С. И.	Сергеев А. П.	6	5.244	0.2
12.1.2.	Проработка литературных источников	13.02.2019 13:03:40	07.02.2019 14.02.2019	Примаков С. И.	Сергеев А. П.	6	0.006	0.1
12.1.3.	Анализ полученных материалов	13.02.2019 13:09:18	14.02.2019 22.02.2019	Примаков С. И.	Сергеев А. П.	6	0.007	0.1
12.1.4.	Подготовка совещания для обсуждения резу	13.02.2019 13:10:14	21.02.2019 22.02.2019	Примаков С. И.	Тр	6	0.007	0.1
12.1.5.	Подготовка заключительных материалов по р	13.02.2019 13:12:01	25.02.2019 26.02.2019	Примаков С. И.	Тр	6	0.007	0.1
12.2.	Подготовка финансового обоснования	13.02.2019 12:41:28	01.02.2019 27.02.2019	Примаков С. И.	Л	0	0.000	0.000
12.2.1.	Проработка предварительного коммерческог	13.02.2019 13:13:07	01.02.2019 08.02.2019	Примаков С. И.	Л	0	0.000	0.000
12.2.2.	Провести совещания с заинтересованными л	13.02.2019 13:14:38	11.02.2019 13.02.2019	Примаков С. И.	Л	1	0.000	0.000
12.2.3.	Провести совещания с исполнителями	13.02.2019 13:15:35	13.02.2019 22.02.2019	Примаков С. И.	Левина О. С.	0	0.000	0.000
12.2.4.	Подготовить заключение по результату прор	13.02.2019 13:16:28	22.02.2019 26.02.2019	Примаков С. И.	Левина О. С.	0	0.000	0.000
12.2.5.	подготовить служебные записки по результ	13.02.2019 13:17:06	26.02.2019 27.02.2019	Примаков С. И.	Левина О. С.	1	2.309	0.028
12.3.	Разработка Т	13.02.2019 14:01:17	28.02.2019	Примаков С. И.	Баранов А. В.	0	5.169	2.952
12.3.1.	Проработка им	13.02.2019 14:01:17	24.02.2019 19.02.2019	Примаков С. И.	Баранов А. В.	9	4.806	2.649
12.3.2.	Подготовка биб	13.02.2019 14:01:17	18.02.2019 21.02.2019	Примаков С. И.	Баранов А. В.	6	0.000	0.000
12.3.3.	Проработка Би	13.02.2019 14:01:17	15.02.2019 19.02.2019	Примаков С. И.	Баранов А. В.	8	0.363	0.3
12.3.4.	формировани	13.02.2019 14:01:17						
12.3.5.	Принять участие	13.02.2019 14:01:17						
12.3.6.	подготовить и разослать заключительный до	13.02.2019 14:01:17						
12.4.	Компоновочная проработка	13.02.2019 12:42:18						
12.4.1.	Провести предварительную проработку	13.02.2019 14:02:27						

9 12 24 163 1284

Общая
Трудоемкость

Плановая
Трудоемкость

Фактическая
Трудоемкость

Фамилия ИО
Руководителя

Фамилия ИО
Исполнителя

Состояние
хода работ

Программа Планирование Окно Чат

Чат. 8.1.7. Разработать таблицу идентификации транспортных средств :

Полный список пользователей

1. Баранов А. В.

2. Валерьев А. Ф.

3. Васильева М. Г.

4. Воробьев В. И.

5. Демидов Г. К.

6. Зайцев Д. В.

7. Иванов И. Н.

8. Инна С. А.

9. Кротович И. В.

10. Куцеволов А. В.

Избранный список пользователей

Всего: 27 | Выделено: 1

Окно чата

1. <10.01.2019 14:37:56> Валерьев А. Ф. -> Демидов Г. К. :
Вам утверждена новая работа.
Комментарий: "Необходимо разрабатывать таблицу категорий транспортных средств например, N1 - для перевозки грузов с полной массой до 3,5 т"

2. <12.01.2019 20:28:22> Демидов Г. К. -> Валерьев А. Ф. :
http://www.autoscience.ru/Materialu/Vvedenie_v_spec/Klassifikaciya_TC.pdf

3. <12.01.2019 20:28:38> Демидов Г. К. -> Валерьев А. Ф. :
[Категории ТС.docx \(размер: 15,73 Кб\)](#)

4. <12.01.2019 20:28:49> Демидов Г. К. -> Валерьев А. Ф. :
Изменение процента готовности работы на значение 100 %

Демидов Г. К.;

Окно сообщений

Окно передачи файлов


Адресная переписка

Копии рабочих файлов

История хода работ

Программа Планирование

Основное окно (Электронный график).

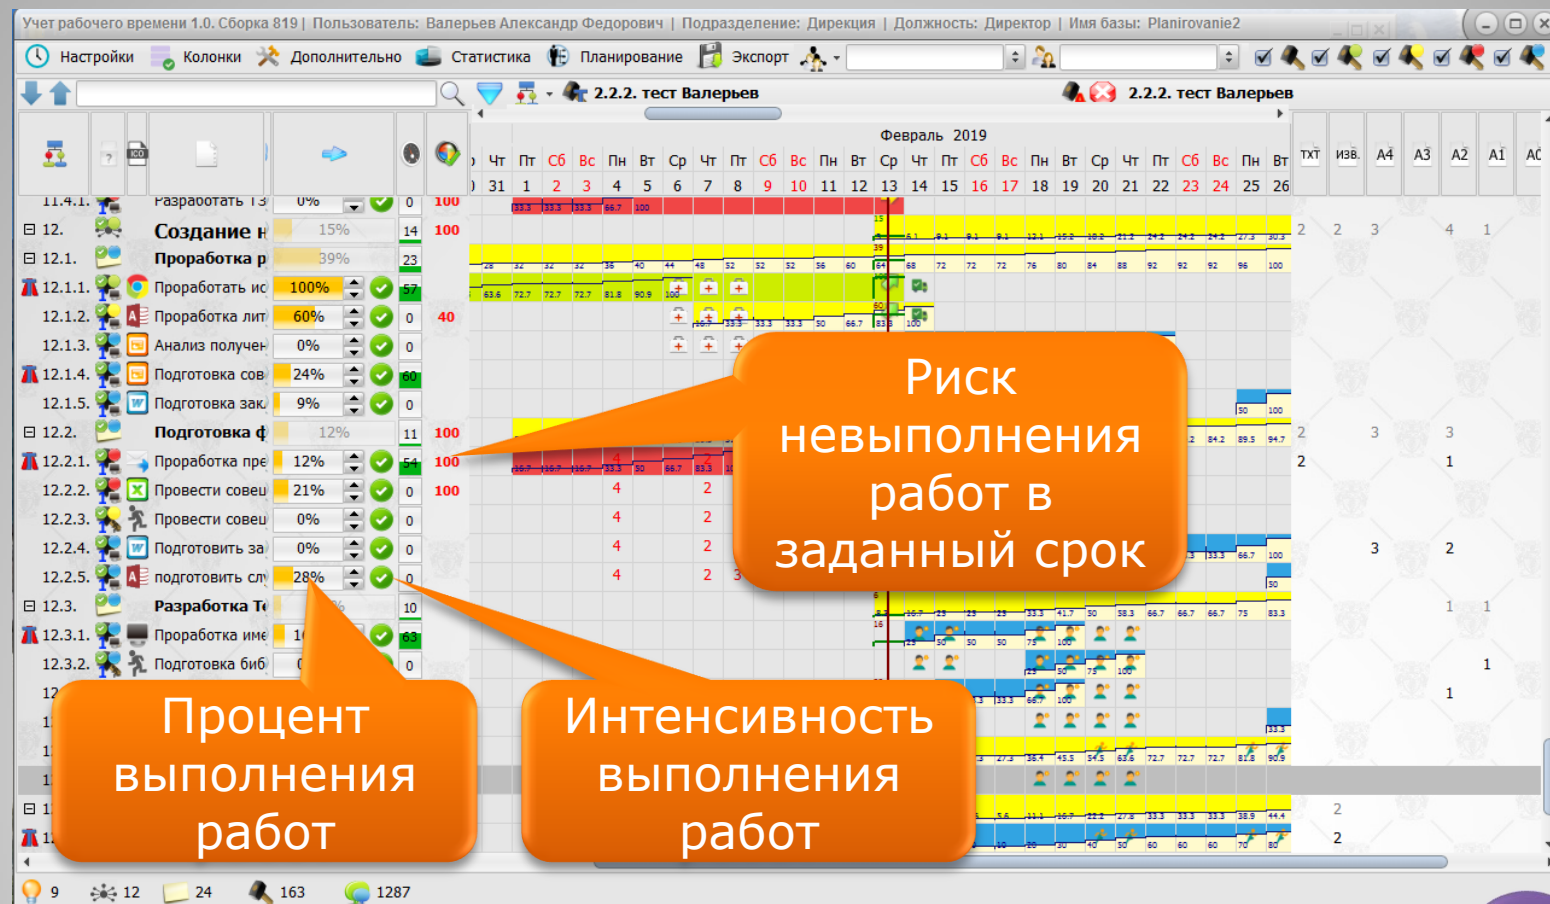

Программа Планирование Основное окно (“Шахматка”).

Календарь –
месяц, год

Календарь –
день недели,
дата

Больничный
лист

Командировка

Отпуск

Выполненная
работа

Невыполненная
работа

Работа в
состоянии
исполнения

Текущий день

Будущая
работа

Программа Планирование

Основное окно (Увеличенное окно “Шахматка”).

Графическое отражение
тенденции изменения
процента реального
выполнения работ

Графическое
отражения
планового
процента
выполнения
работ

Числовое
значение
планового
процента
выполнения
работ

Графическое
отражения
реального
процента
выполнения
работ

Числовое
значение
реального
процента
выполнения
работ



Увеличенное окно “Бумажные “ результаты работ.

[illegible]

Количество разработанных чертежей формата A2, для Проекта


Количество разработанных чертежей формата A2, для Графика

Количество разработанных чертежей формата А2, для определенной Работы

Программа Планирование

Панель Управления


Фильтр по статусу работы



Поиск работ по ее названию

Фильтр по фамилии руководителя

Фильтр по фамилии Исполнителя



Текущая работ

Активная работа


Программа Планирование

Окно Планирование работ

Исполнитель


1.1.15	Работа Щепоткин
5.9.	Сергеев А. П.
12.1.3	Анализ полученных материалов
12.1.1	Проработать источники Интернет
12.1.2	Проработка литературных источников

Плановая
трудоемкость

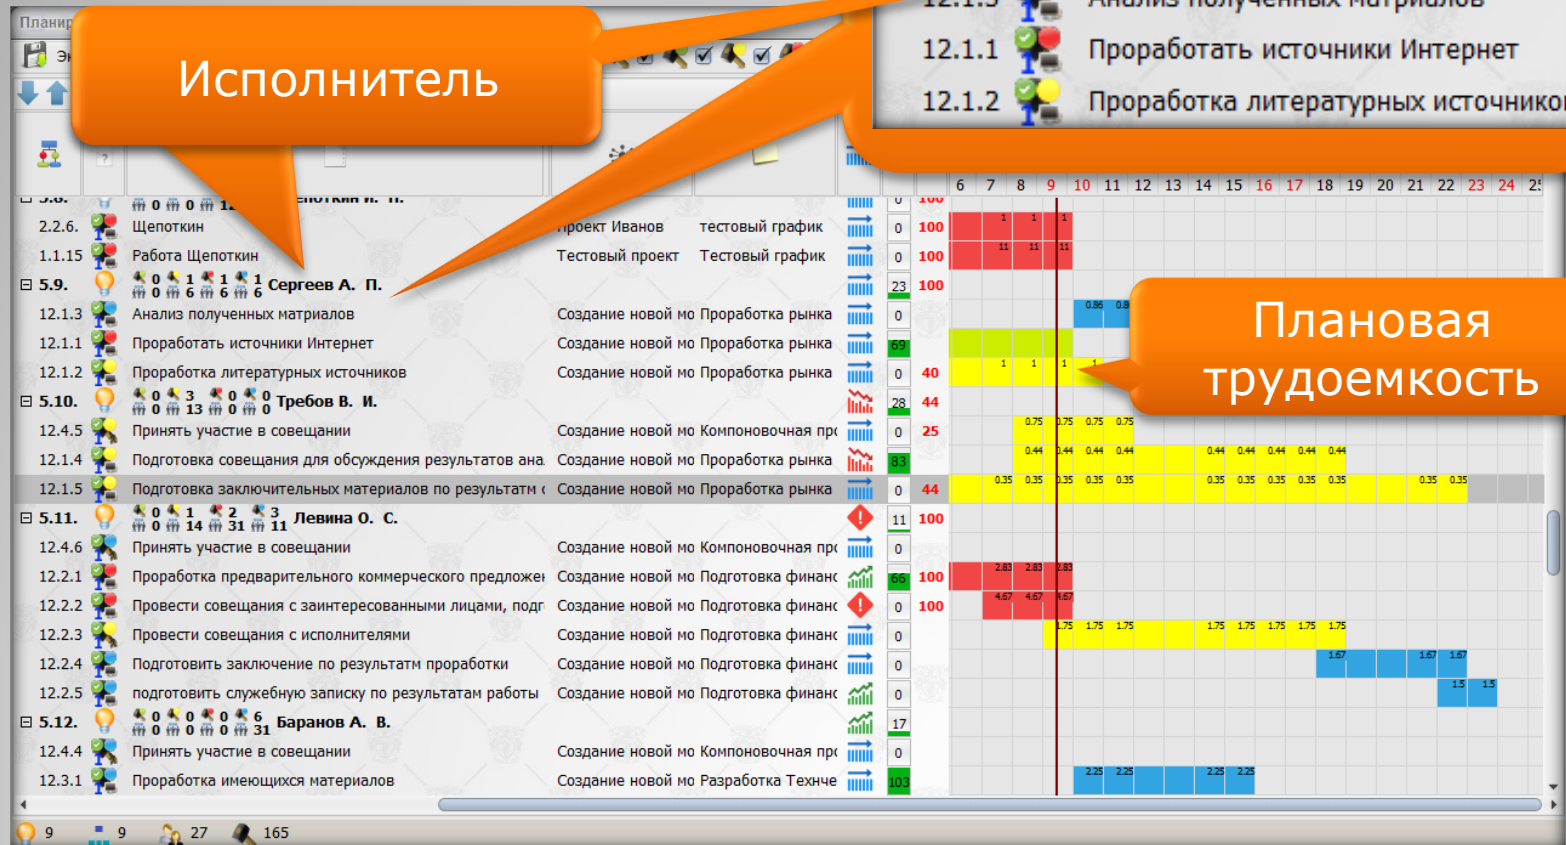


Программа Планирование

Окно Статистика (Закладка Исполнитель)

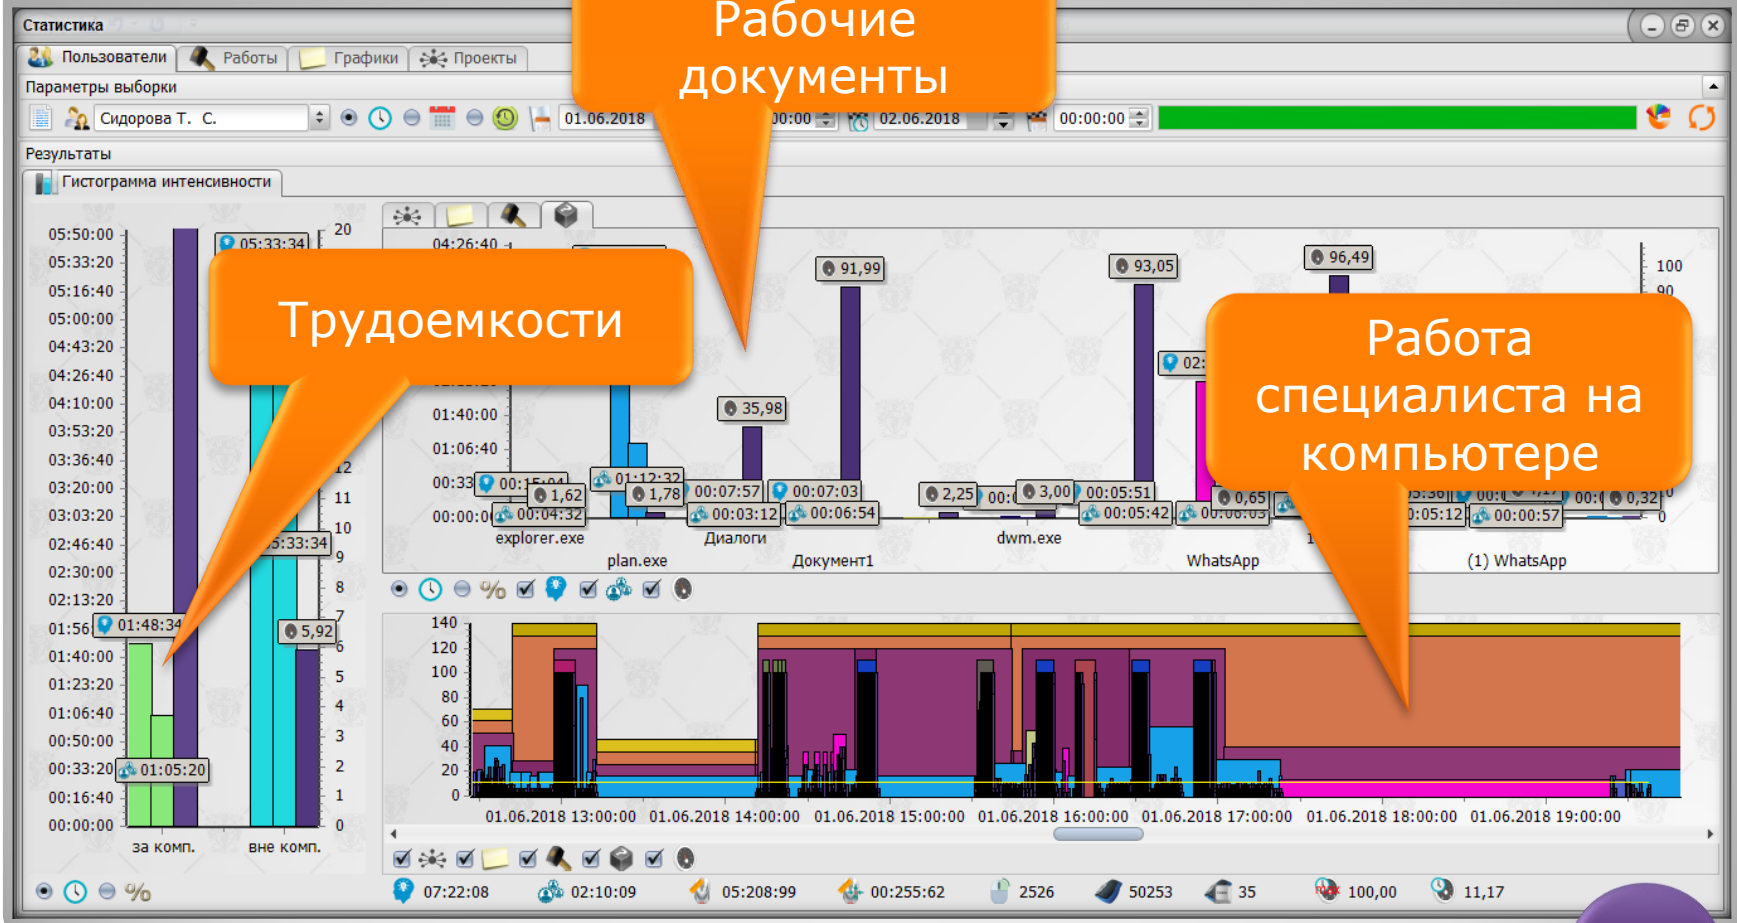


Программа Планирование

Пример статистики пользователя

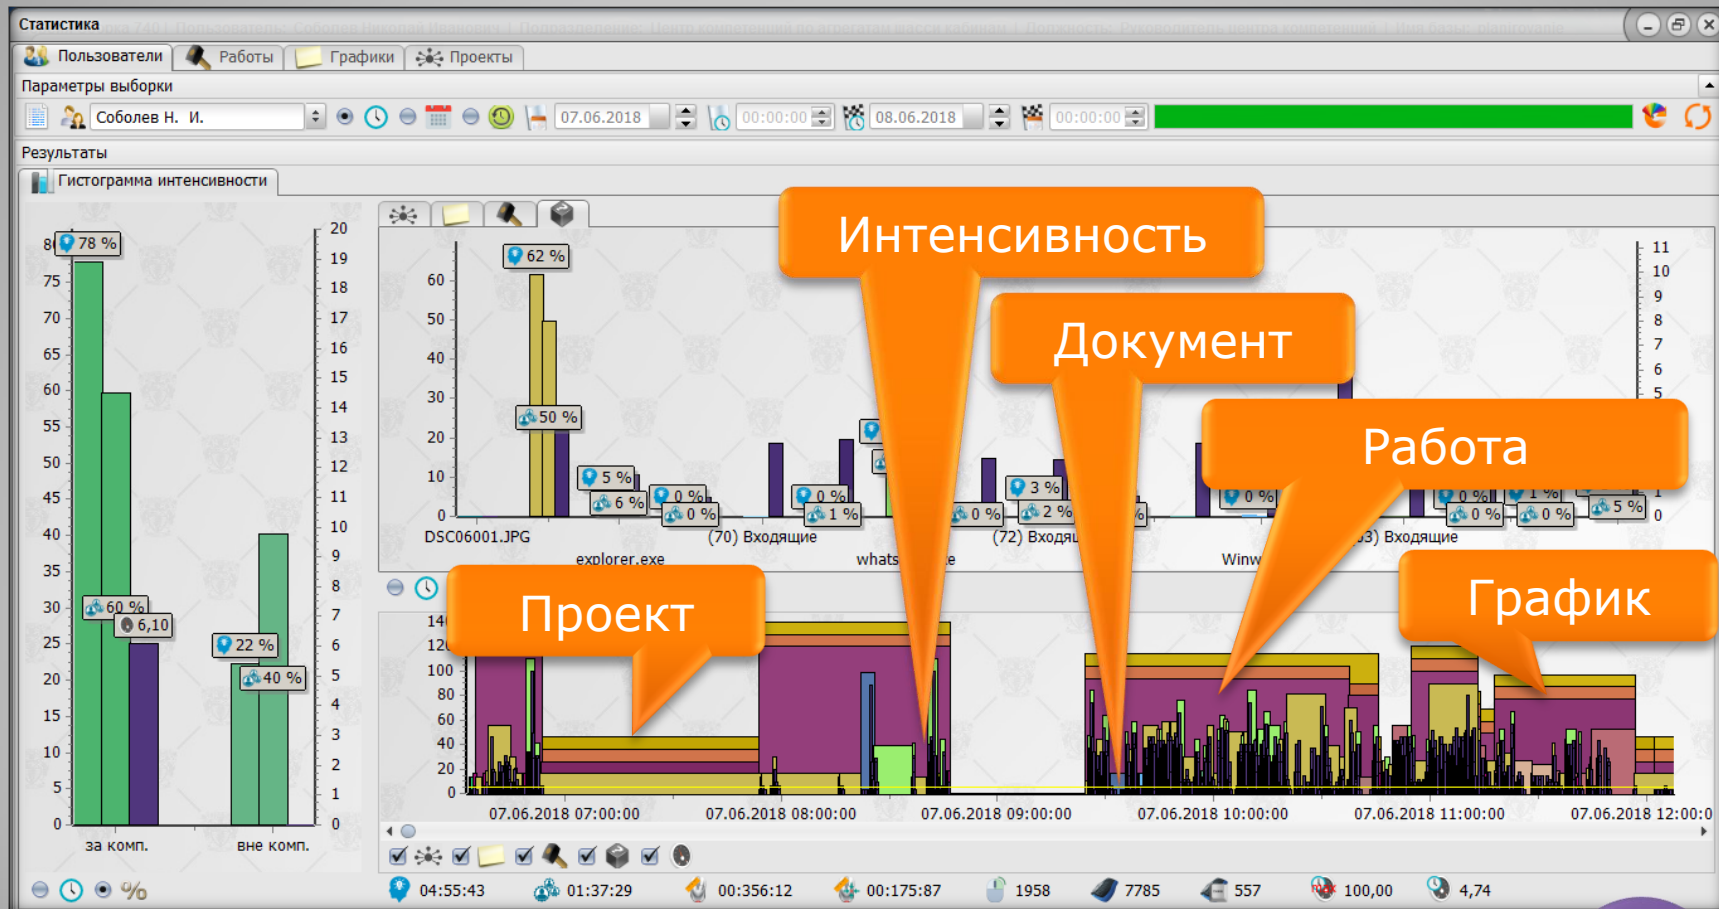


Программа Планирование

Пример статистики Графика

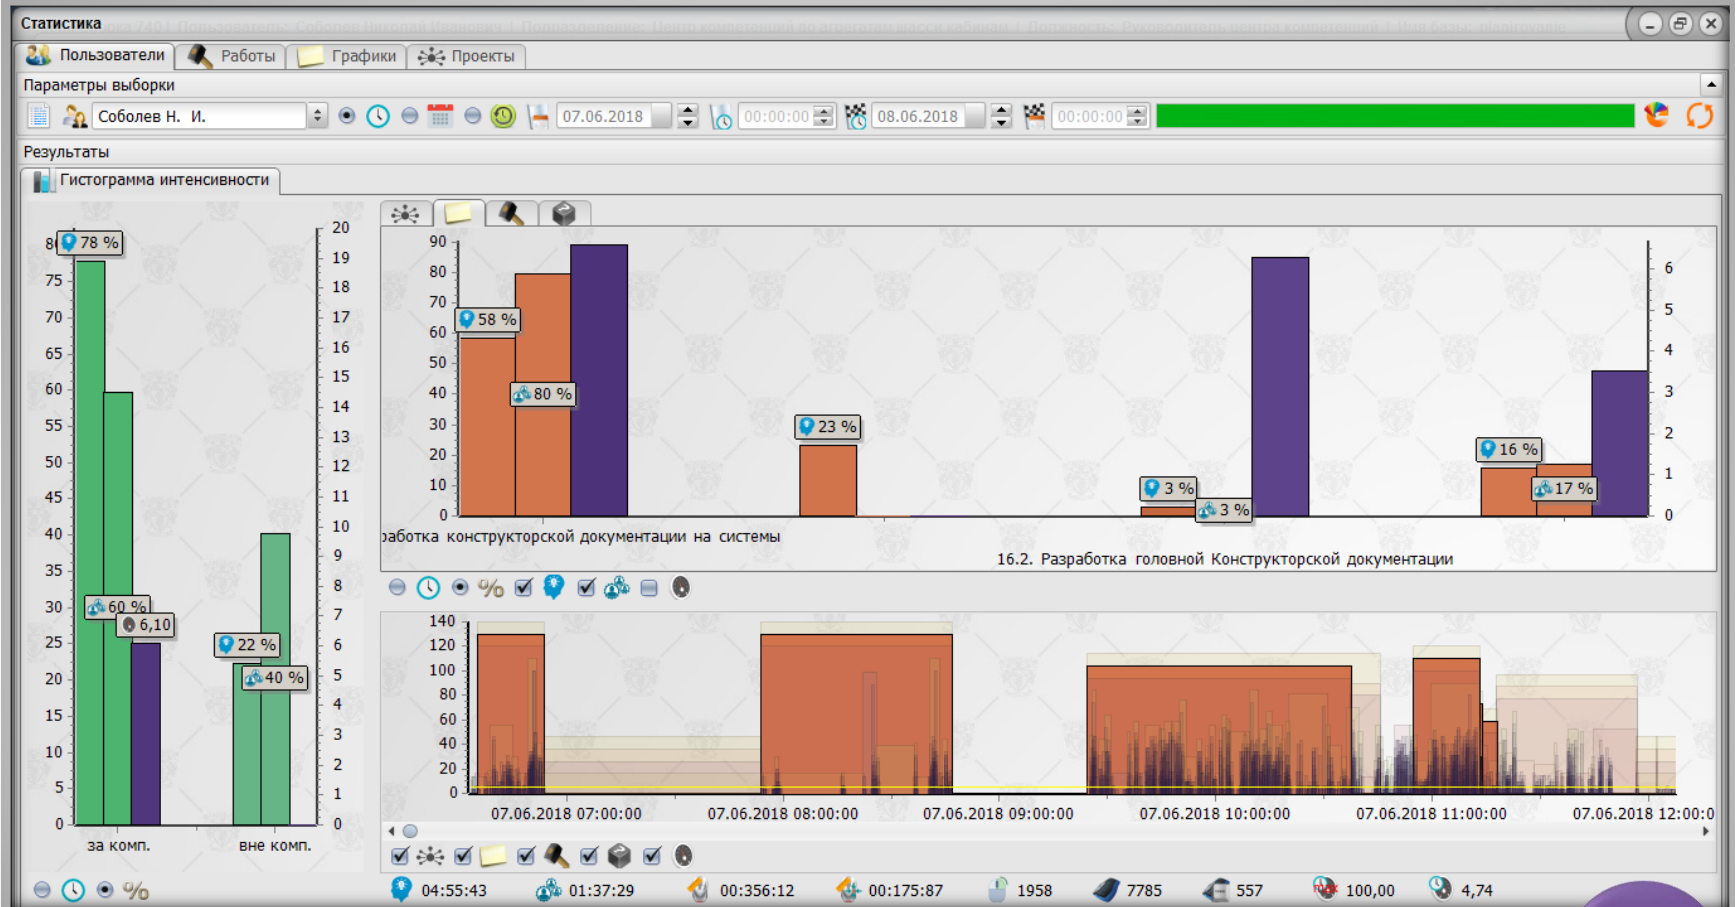

Статистика. Сводная таблица

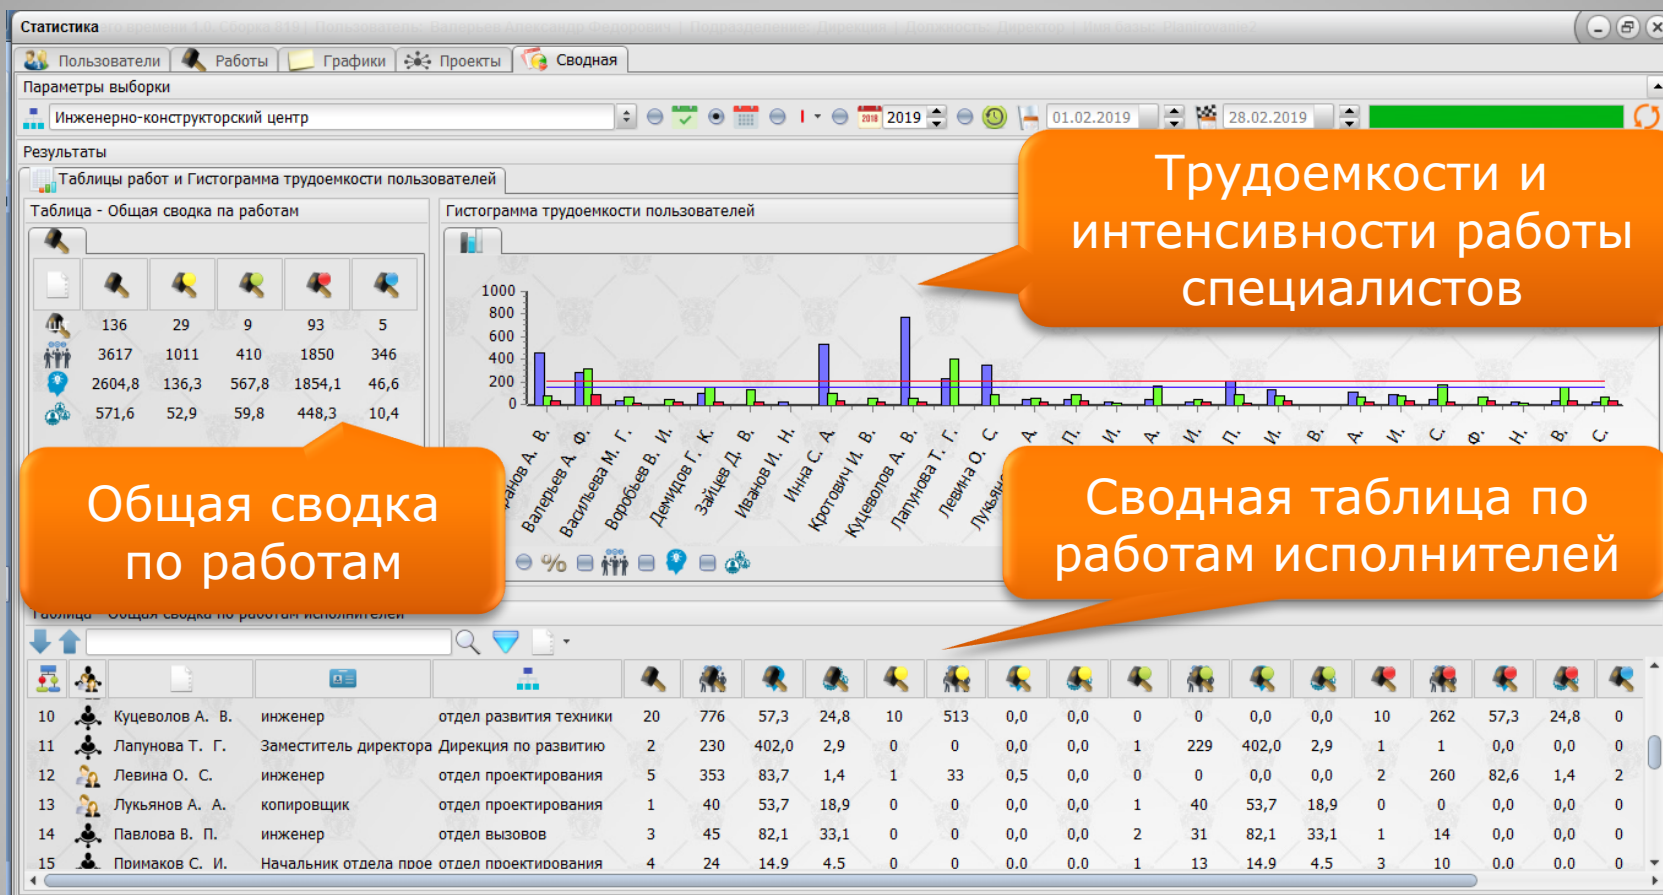

Общая сводка по работам

Количество работ

Плановая Трудоемкость работ

Общая Трудоемкость работ

Фактическая Трудоемкость работ

Таблица - Общая сводка па работам

					
					
	136	29	9	93	5
	3617	1011	410	1850	346
	2604,8	136,3	567,8	1854,1	46,6
	571,6	52,9	59,8	448,3	10,4

Гистограмма трудоемкости пользователей

Шкала трудоемкостей


Плановая трудоемкость

Общая трудоемкость

Фактическая трудоемкость

Номинальная планируемая трудоемкость

Номинальная планируемая трудоемкость с учетом допустимых переработок

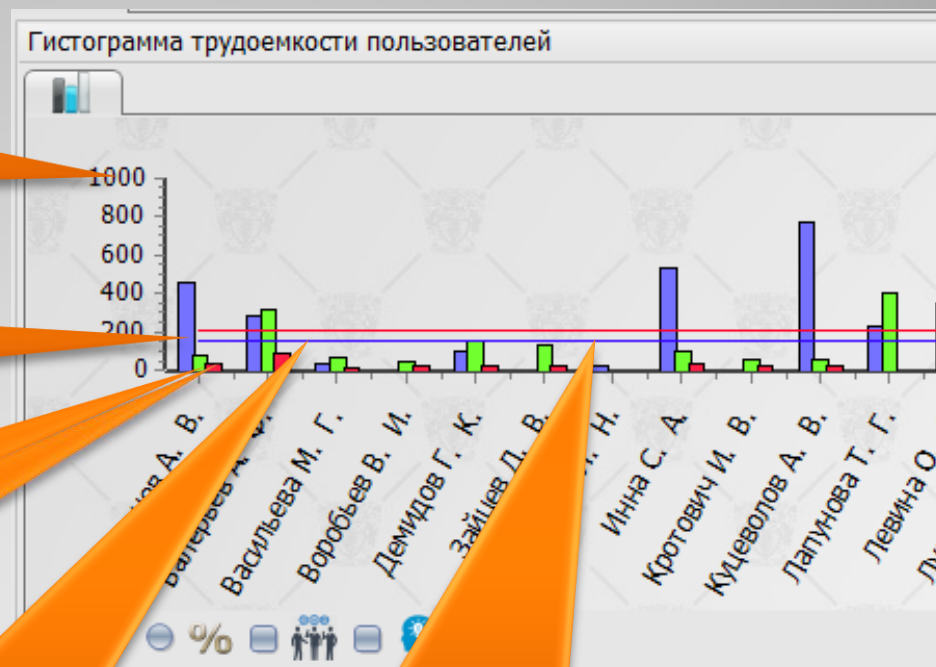

Программа Планирование

Пример статистики пользователя КРІ

Сводный
коэффициент
эффективности

0,22

Сводные показатели для пользователя за период времени

Пользователь

 Сидорова Татьяна Сергеевна
 Ведущий инженер-конструктор
 Отдел конструкторский систем управления
 от 02.06.2018 до 03.06.2018

Название показателя					
Количество работ, шт	18	8	0	10	0
Количество работ в день среднее, шт	12,00	2,00	0,00	10,00	0,00
Количество плановых работ, шт	0	0	0	0	0
Количество внеплановых работ, шт	18	8	0	10	0
Количество срочных работ, шт	13	6	0	7	0
Длительность плановых работ, дд:чч:мм	03:19:30	03:19:30	00:00:00	00:00:00	00:00:00
Количество работ в день максимальное, шт	12	2	0	10	0
Количество работ со сроком часы, шт	13	6	0	7	0
Длительность работы вне компьютера, чч:мм:сс	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
Соотношение длительности работы на компьютере к длительности работы вне	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая трудоемкость, чч:мм:сс	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
Фактическая трудоемкость, чч:мм:сс	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00	00:00:00
Соотношение общей и фактической трудоемкостей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плановая трудоемкость, чч:мм:сс	17:06:53	17:06:53	00:00:00	00:00:00	00:00:00
Соотношение общей к плановой трудоемкости	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средняя интенсивность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Максимальная интенсивность	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работа по категории обычная, шт	17	8	0	9	0
Работа по категории разовая, шт	1	0	0	1	0
Работа по категории постоянная, шт	0	0	0	0	0

04:00:58 00:04:37 00:29:14 00:15:44 91 103 4 40,00 0,12

Программа Кадры

Основное окно.

Планирование. Кадры v 1.17 | База данных: Planirovanie

Должности Структурные подразделения Календарь Временные константы Отображаемые параметры

Кадры

Фото	Фамилия	Имя	Отчество	Пол	Уровень доступа	Пароль	Должность
	Хомченко	Алла	Сергеевна	Ж	0	*****	Инженер-технолог I категории
	Селиванов	Виталий	Николаевич	М	0	*****	Инженер-конструктор I категории
	Воротников	Александр	Петрович	М	0	*****	Инженер-конструктор II категории
	Жвакина	Оксана	Семеновна	Ж	0	*****	Инженер-конструктор III категории
	Соколова	Юлия	Сергеевна				Инженер-технолог I категории
	Лисицын	Виктор	Егорович				Инженер-конструктор I категории
	Багичева	Олеся	Викторовна				Инженер-конструктор II категории
	Казанцева	Анна	Васильевна				Инженер-конструктор III категории
	Сергушкин	Василий					Инженер-конструктор I категории
	Шустова	Татьяна					Инженер-конструктор II категории
	Глуценко	Дмитрий					Инженер-конструктор III категории
	Кулешов	Евгений	Сергеевич	М	0	*****	Инженер-конструктор I категории
	Перов						Инженер-конструктор II категории

142 91 50

Учет времени отгулов, отпусков, командировок, больничных, переработок. Табличная форма

Графическое представление отгулов, отпусков, командировок, больничных, переработок | Временной

Май 2018

с	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	
3	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

0 дней 0 дней 0 дней 0 дней +1 0 часов 88 дней 0 дней 0 дней 0 дней 0 дней +1 0 часов 16 дней

Должность

Отчество

Имя

Фамилия

Дата рождения, возраст, дата приема на работу, стаж и др поля

Шахматка

Программа Кадры

Структура предприятия.




Реализация концепции

Любая информация в **ОДИН** клик

Электронный документооборот

Программа Планирование

Планирование –
основа
концепции

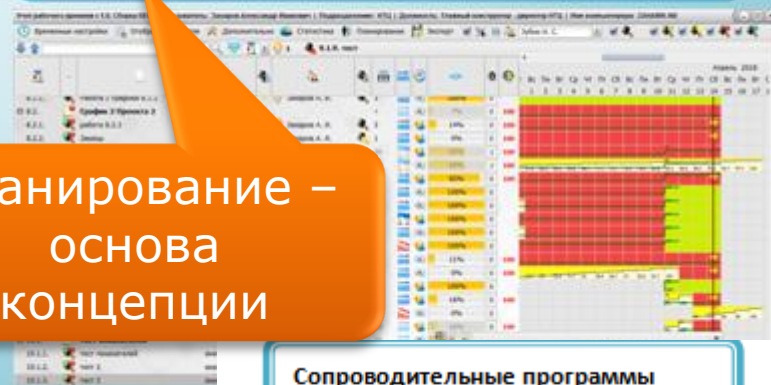

Сопроводительные программы

- Перевод физических величин
- Размерные цепи
- Полином

Канцелярия и организация работ



Канцелярия: Приказы, Графики, Протоколы, Отчеты, Программы и проч.



Архив фото и кинодокументов



Кадры




Визитки

3D каталоги




Автомобиль и составные узлы

Базы данных

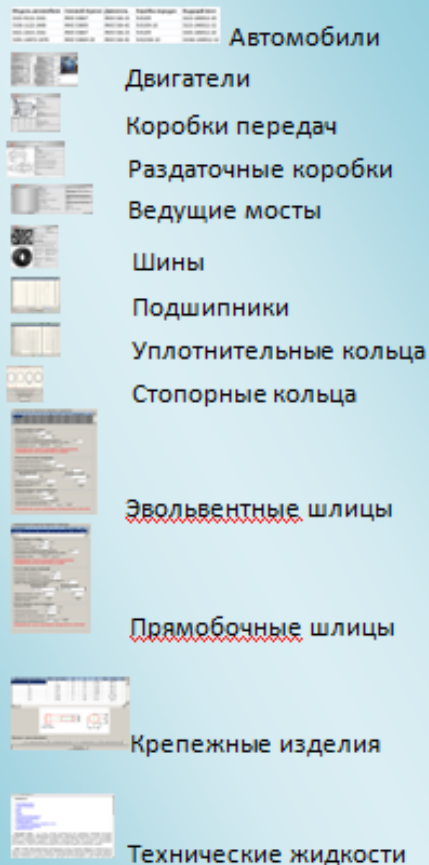

Кабины, Платформы, Диски,
карданные валы, рамы, др.

Информационная часть

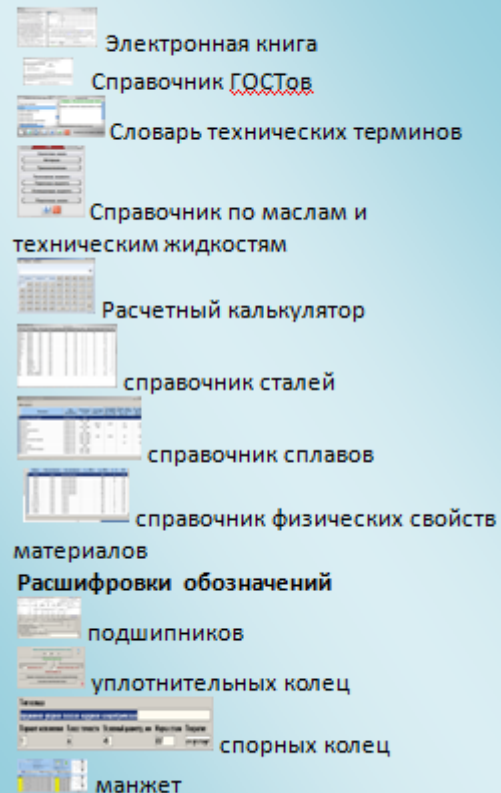

Расчеты

